

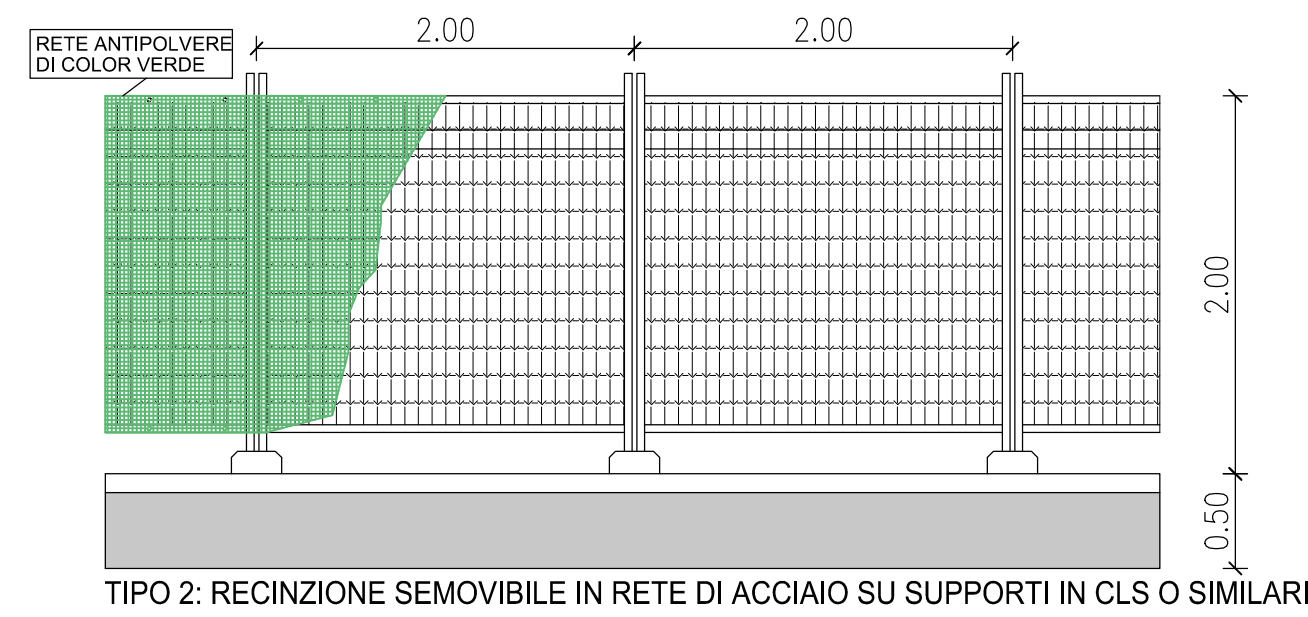



ESEMPI DI REALIZZAZIONE DELLE RECINZIONI

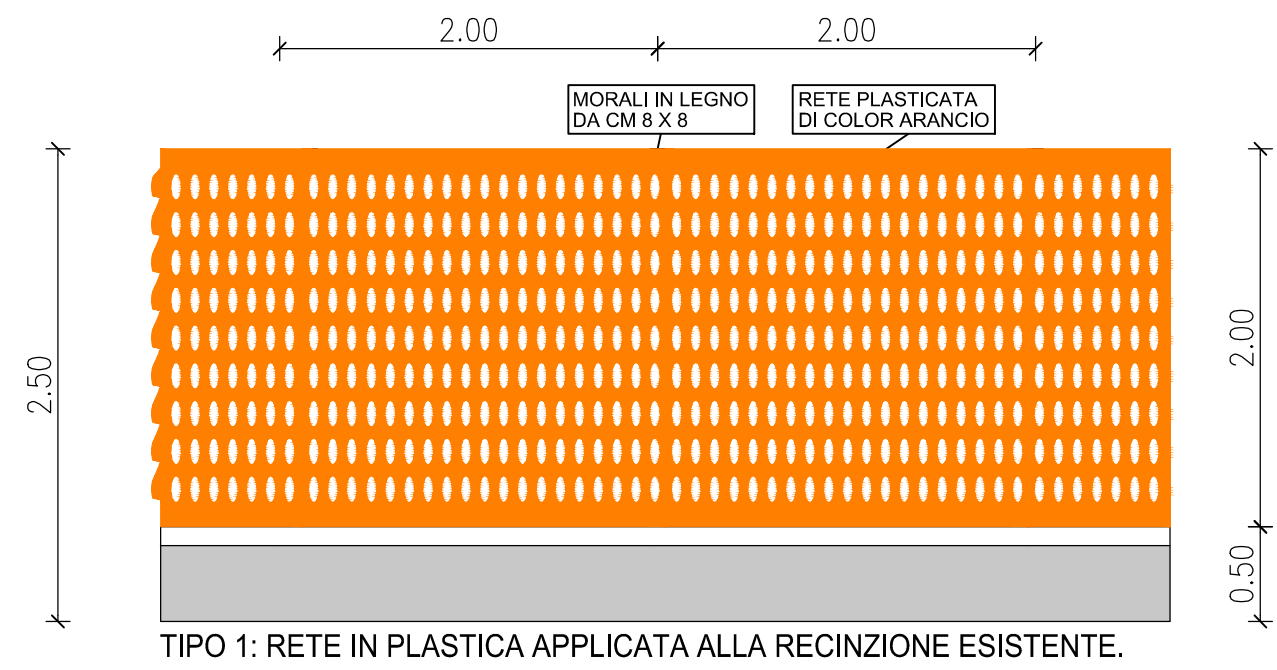

FASE 1

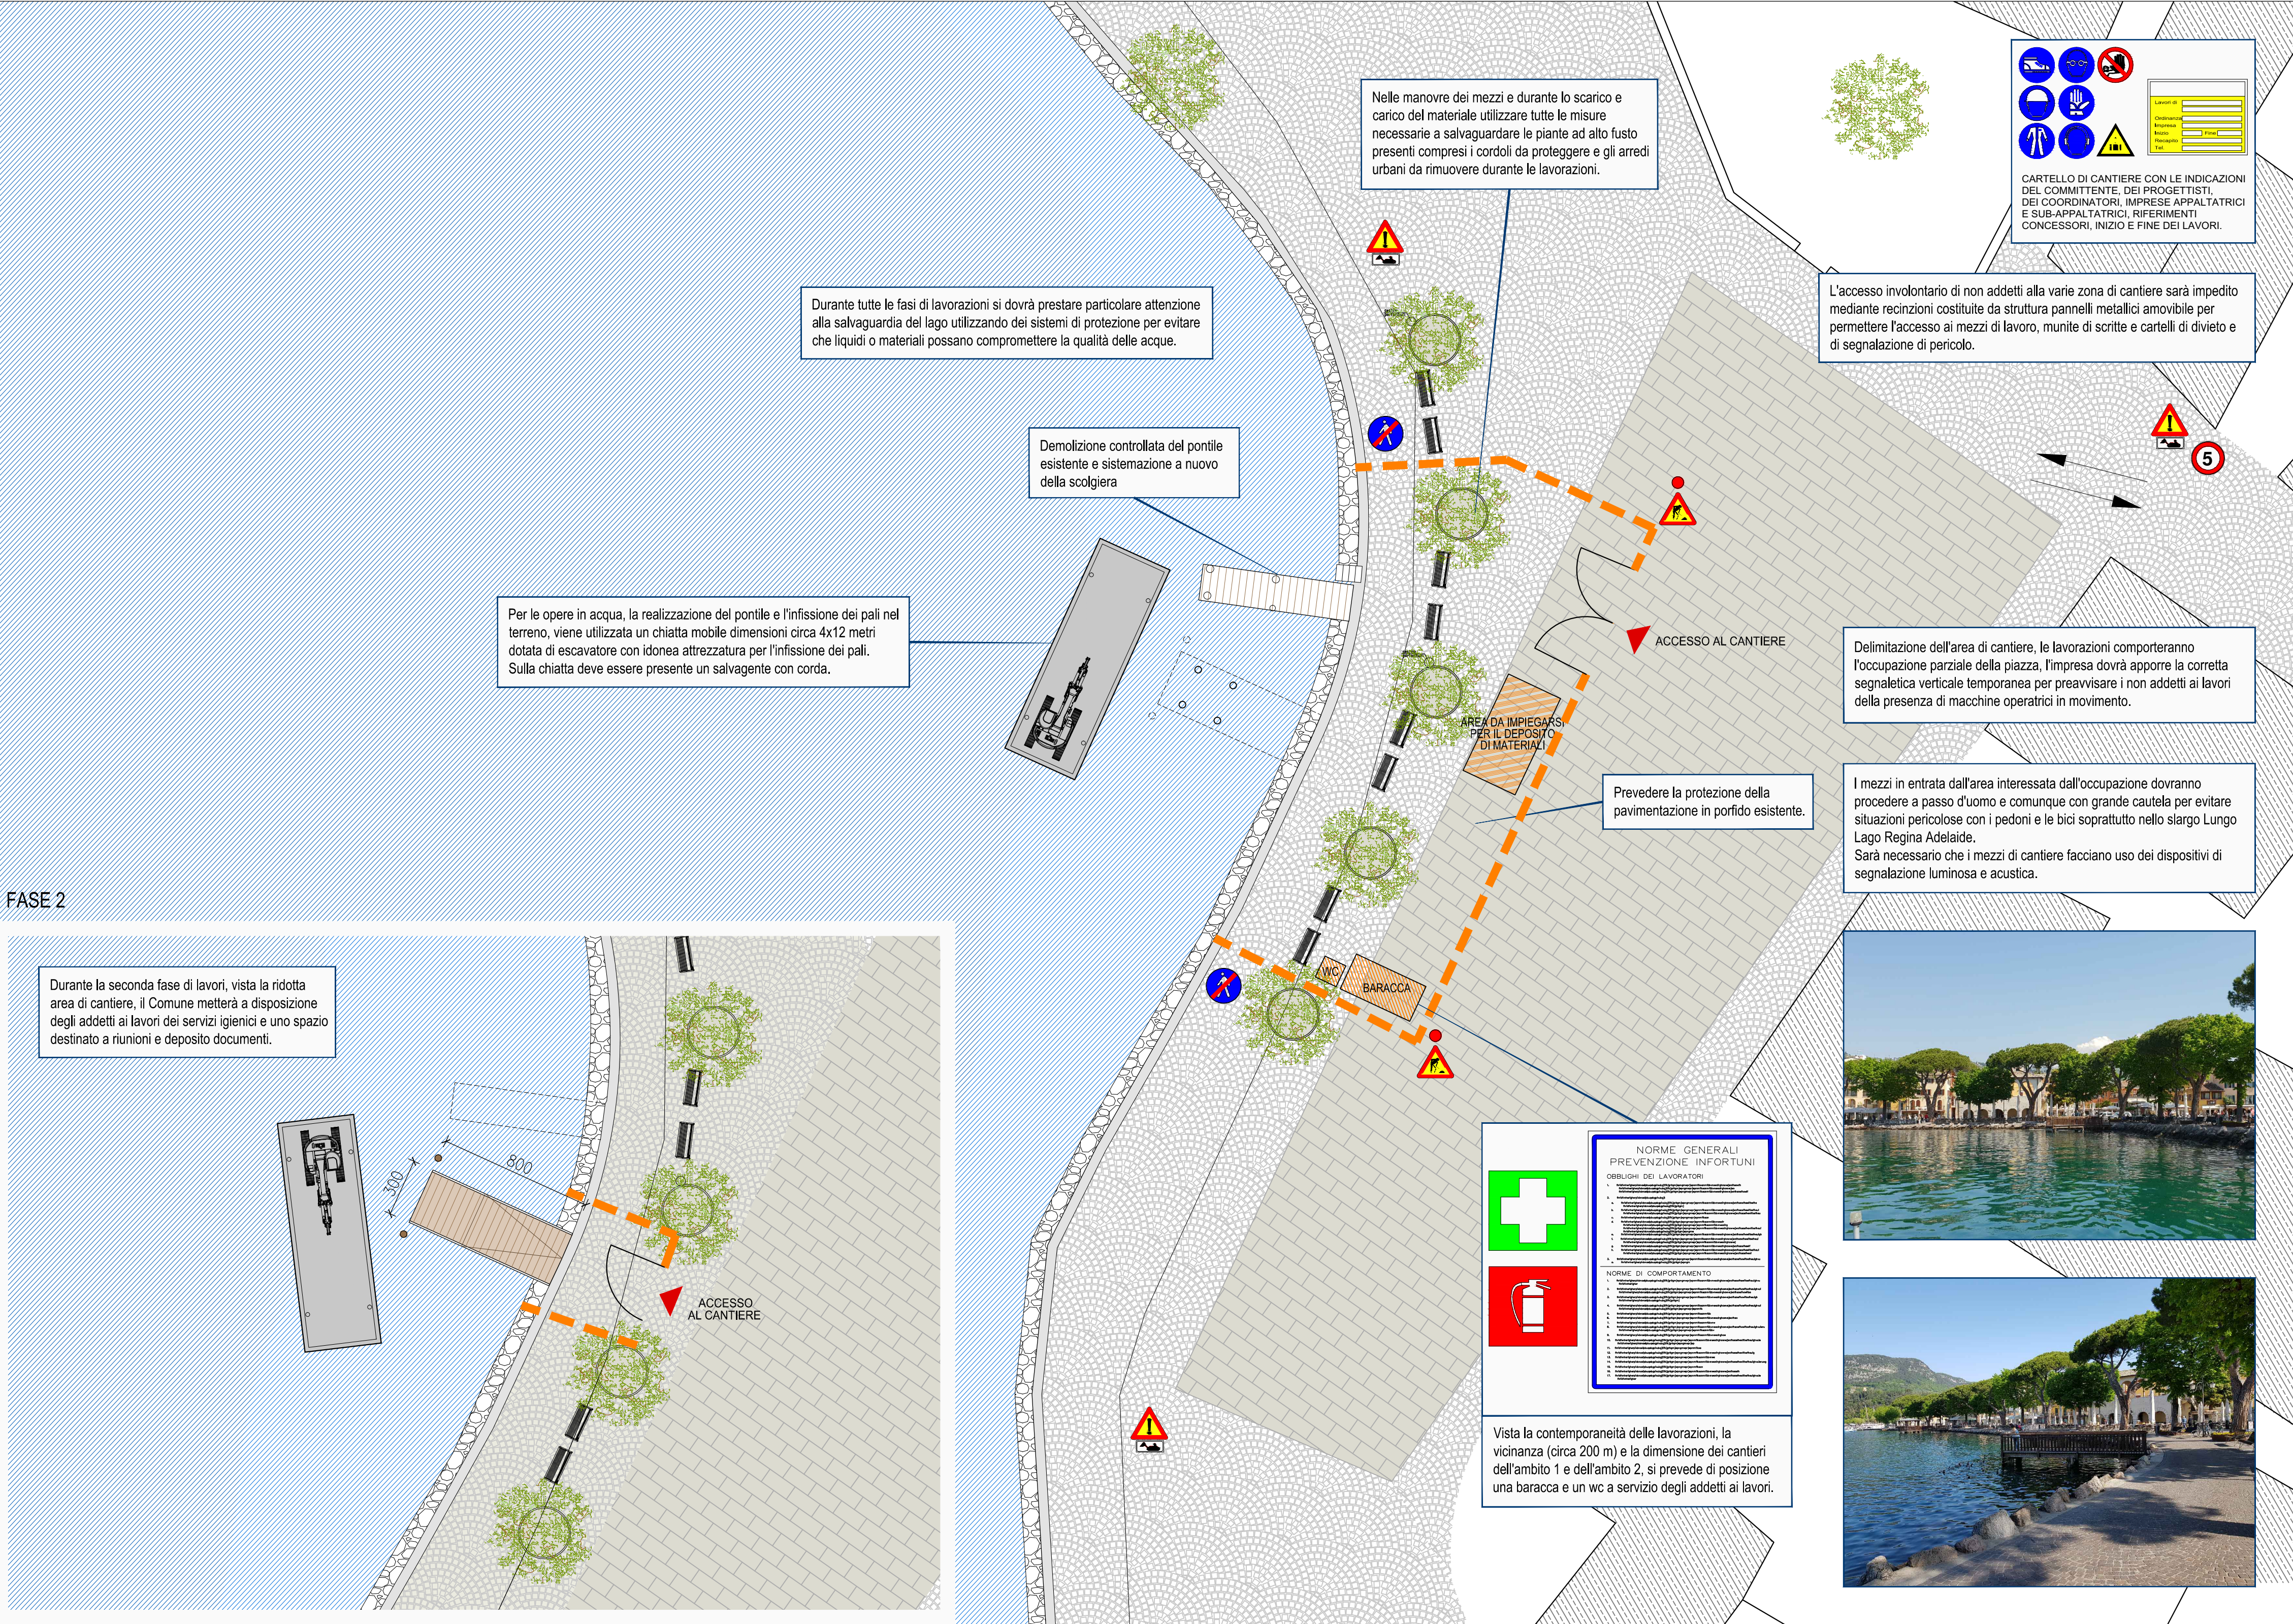

FASE 2

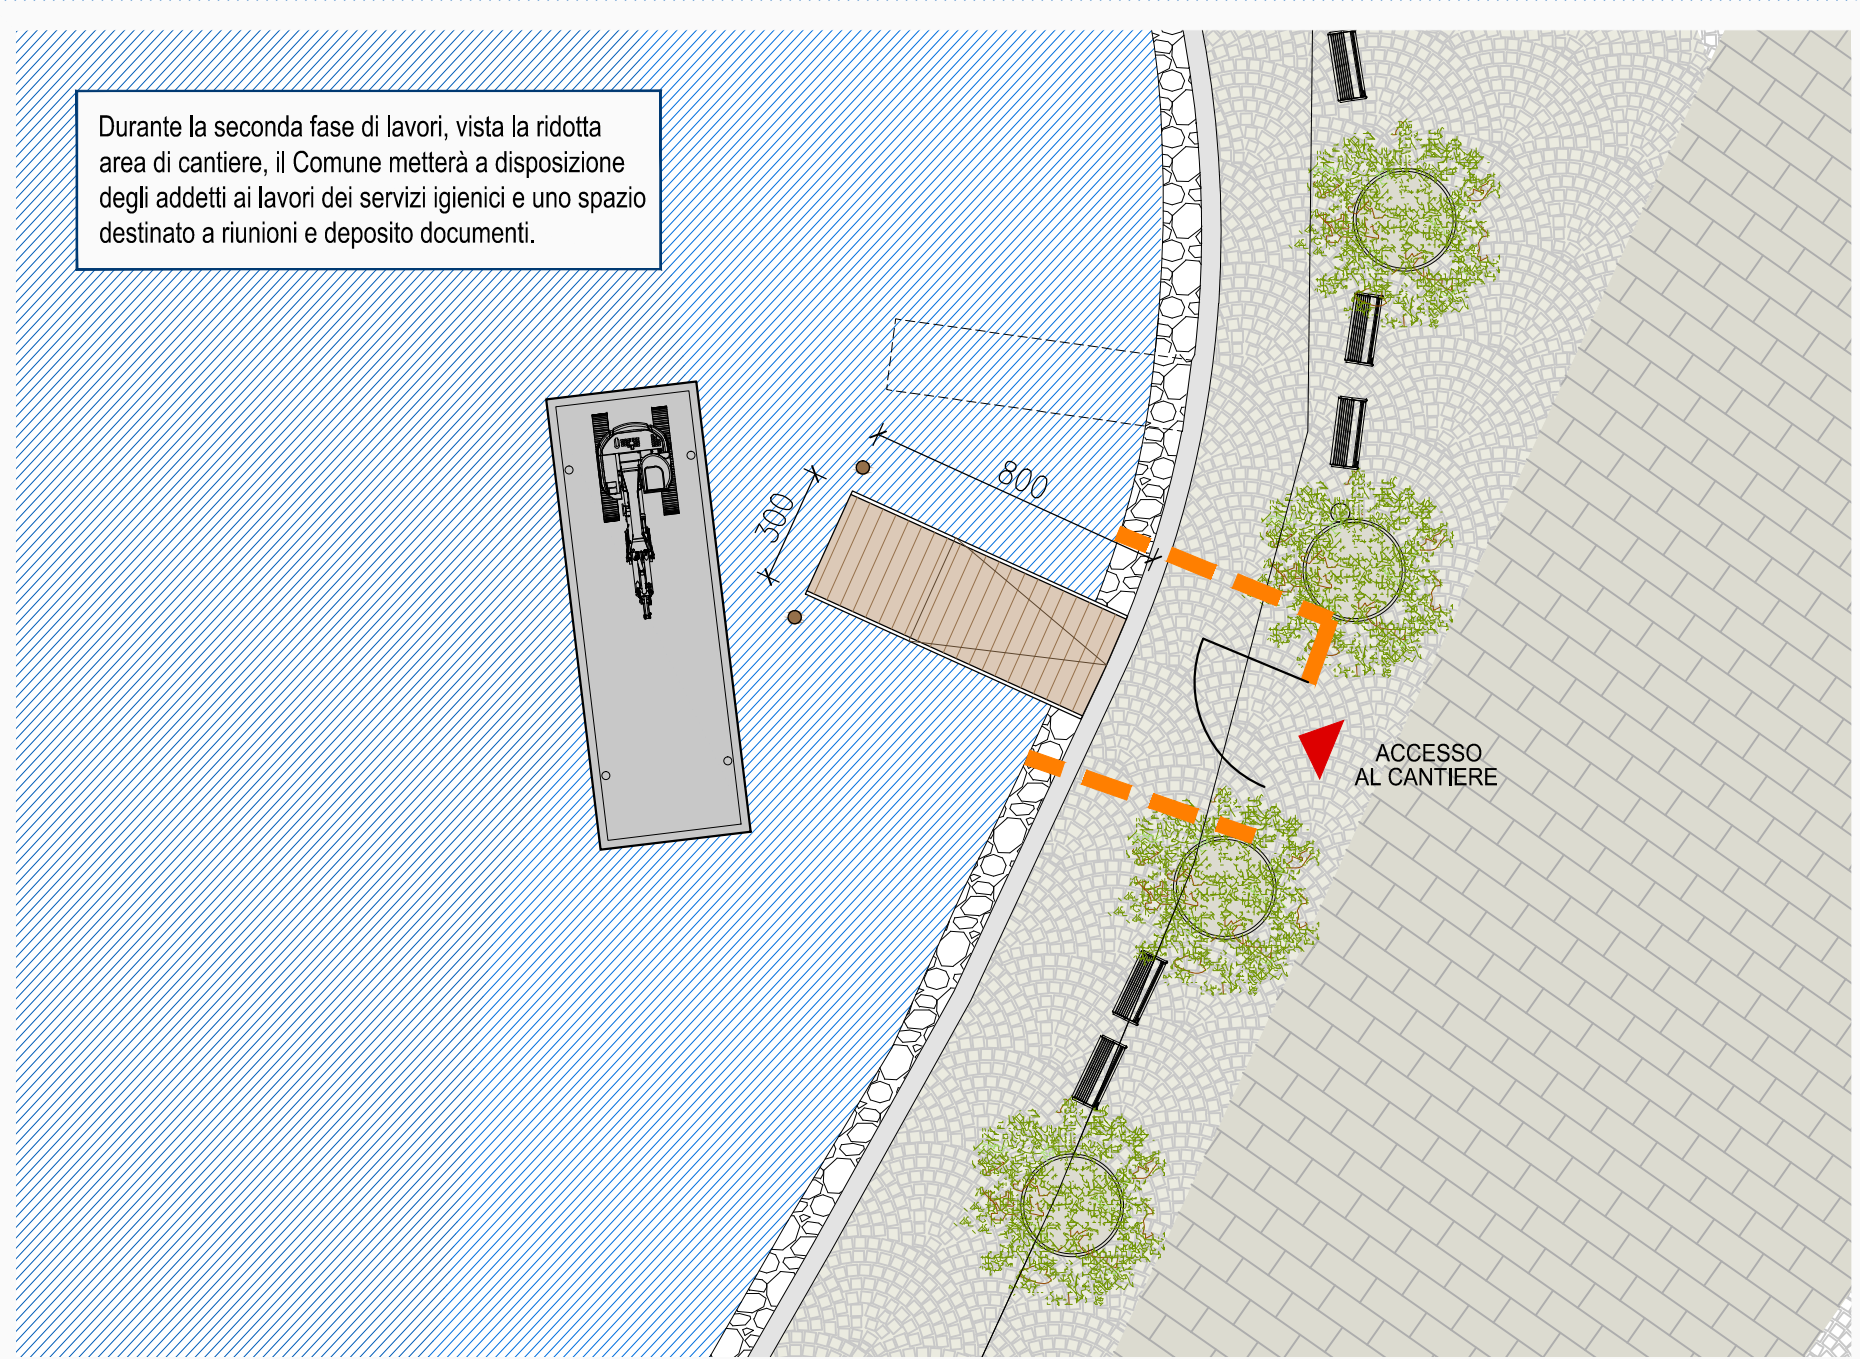

FASI DI LAVORO

- FASE 1: DAL 1 OTTOBRE AL 9 NOVEMBRE
- Accesso del cantiere da via S. Francesco d'Assisi
  - Occupazione temporanea dello slargo Lungo Lago Regina Adelaide
  - Demolizione del pontile esistente e ripristino muro scogliera
  - Realizzazione degli ancoraggi a lago e dei micropali
- FASE 2: DOPO L'11 NOVEMBRE
- Area del cantiere limitata
  - Montaggio della carpenteria metallica
  - Ripristino pavimentazione
  - Opere di finitura

NOTE PER LA SICUREZZA

Particolare attenzione deve essere rivolta in tutte le operazioni di manovre lungo i moli, la piazza, lungo lago pedonale per la presenza di pedoni e/o mezzi in movimento. Le operazioni devono essere assistite da un moviere a terra. Il mezzo dovrà segnalare la sua presenza con l'avvisatore acustico (clacson) e fermarsi immediatamente alla presenza di personale a terra. Il mezzo procedere nel senso di marcia una volta accertato che le persone siano in posizione sicura.

A terra in prossimità della riva del lago deve essere collocato un salvagente con corda da utilizzare in caso di emergenza. Le operazioni sulla terra in prossimità della riva devono essere eseguite dagli operatori dotati di giubbotto galleggiante.

Tutto il personale che opera sulla chiatta deve essere dotato di giubbotto di salvataggio. Compreso l'operatore nel mezzo meccanico. Sulla chiatta deve essere presente un salvagente con corda.

La struttura metallica del pontile verrà assemblata in opera direttamente in cantiere. Il mezzo di sollevamento si dovrà collocare sulla chiatta. Le dimensioni ed ingombro deve essere tale da garantire la sicurezza nelle operazioni di posa dell'elemento.

Qualora vi sia la necessità di operare in prossimità dell'elemento da posare gli addetti si posizioneranno su una piccola imbarcazione. Se operano dall'alto sul primo elemento posato gli addetti si devono imbragare e collegarsi con cordino corto (non maggiore di 1.50 metri) alla trave stessa posata.

Le particolari procedure esecutive per la realizzazione del pontile devono essere descritte nel POS dell'impresa esecutrice ed approvate dal CSE.

**FONTANA & LOTTI LORENZI**  
INGEGNERI ASSOCIATI

VIA D. CHIESA, 8 • RIVA DEL GARDA • P. IVA E C.F. 0067290223  
TEL. 0464.552707 • FAX. 0464.559511 • STUDIO@FONTANAELOTTI.IT

il progettista

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROV. DI TRENTO  
--  
dott.ing. ANTONIO LOTTI  
ISCRIZIONE ALBO N° 1238

ESECUTIVO

incarico

APPRODI E SBARCHI PER ATTIVITA' DI PESCA PROFESSIONALE E PESCA TURISMO

committente

COMUNE DI GARDA

aggiornamenti  
revisione

elaborato

INTERVENTO AMBITO 2  
PLANIMETRIA SICUREZZA

data

GIUGNO 2019

scala

1 : 200



n. lavoro

V 17-30

n. disegno

S2
